


屋根塗替え工事



1. コロニアル屋根 施行前

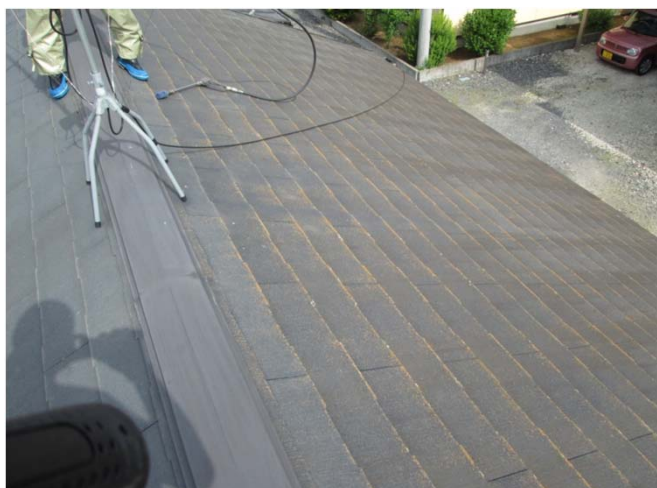

2. 高圧洗浄 状況



3. ヒビ割れ ノンブリード変性シリコンにて補修



4. 2液型エポキシ樹脂シーラー塗布
マイルドシーラーエポ使用



5. 棟板金サビ止め塗り ヒビ割れ補修



6. 仕上げ状況 2液型シリコン樹脂塗料2回塗り仕上げ
ヤネフレッシュSI使用

塗装工事



1. 高圧洗浄後 塗装前状況



2. 高圧洗浄



3. 2液型エポキシ樹脂シーラー 塗布状況



4. 中塗り状況



5. バイオマスシリコン 上塗り完了



6. 施行後 色 バイオマスシリコン ナスコン使用
